



Министерство Российской
Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики

Образовательный модуль.

О системе управления проектами ДВ и Арктики ИСУП «25 городов»

Май 2025 г.

Берман Кирилл

Мастер-планы 22 агломераций

Информационная система управления проектами (ИСУП)

1596

Мероприятий

2315

объектов

>50 тысяч

Контрольных точек

- Система планирования и контроля исполнения на всех уровнях - от всей программы (22 агломерации = 25 городов) до индивидуального объекта.
- Анализ финансирования, контрактации, строительства и исполнения бюджета.
- Анализ обеспеченности ресурсами, в т.ч. кадрами и стройматериалами.
- Контроль всех форм участия: бюджетные, внебюджетные, ГЧП.
- Автоматизация контроля, связь мероприятий и документов.

1800+ пользователей


57 контрольных точек
по каждому объекту

Демонстрация ИСУП
(видео)



Мастер-планы 22 агломераций

Информационная система управления проектами (ИСУП) общий вид

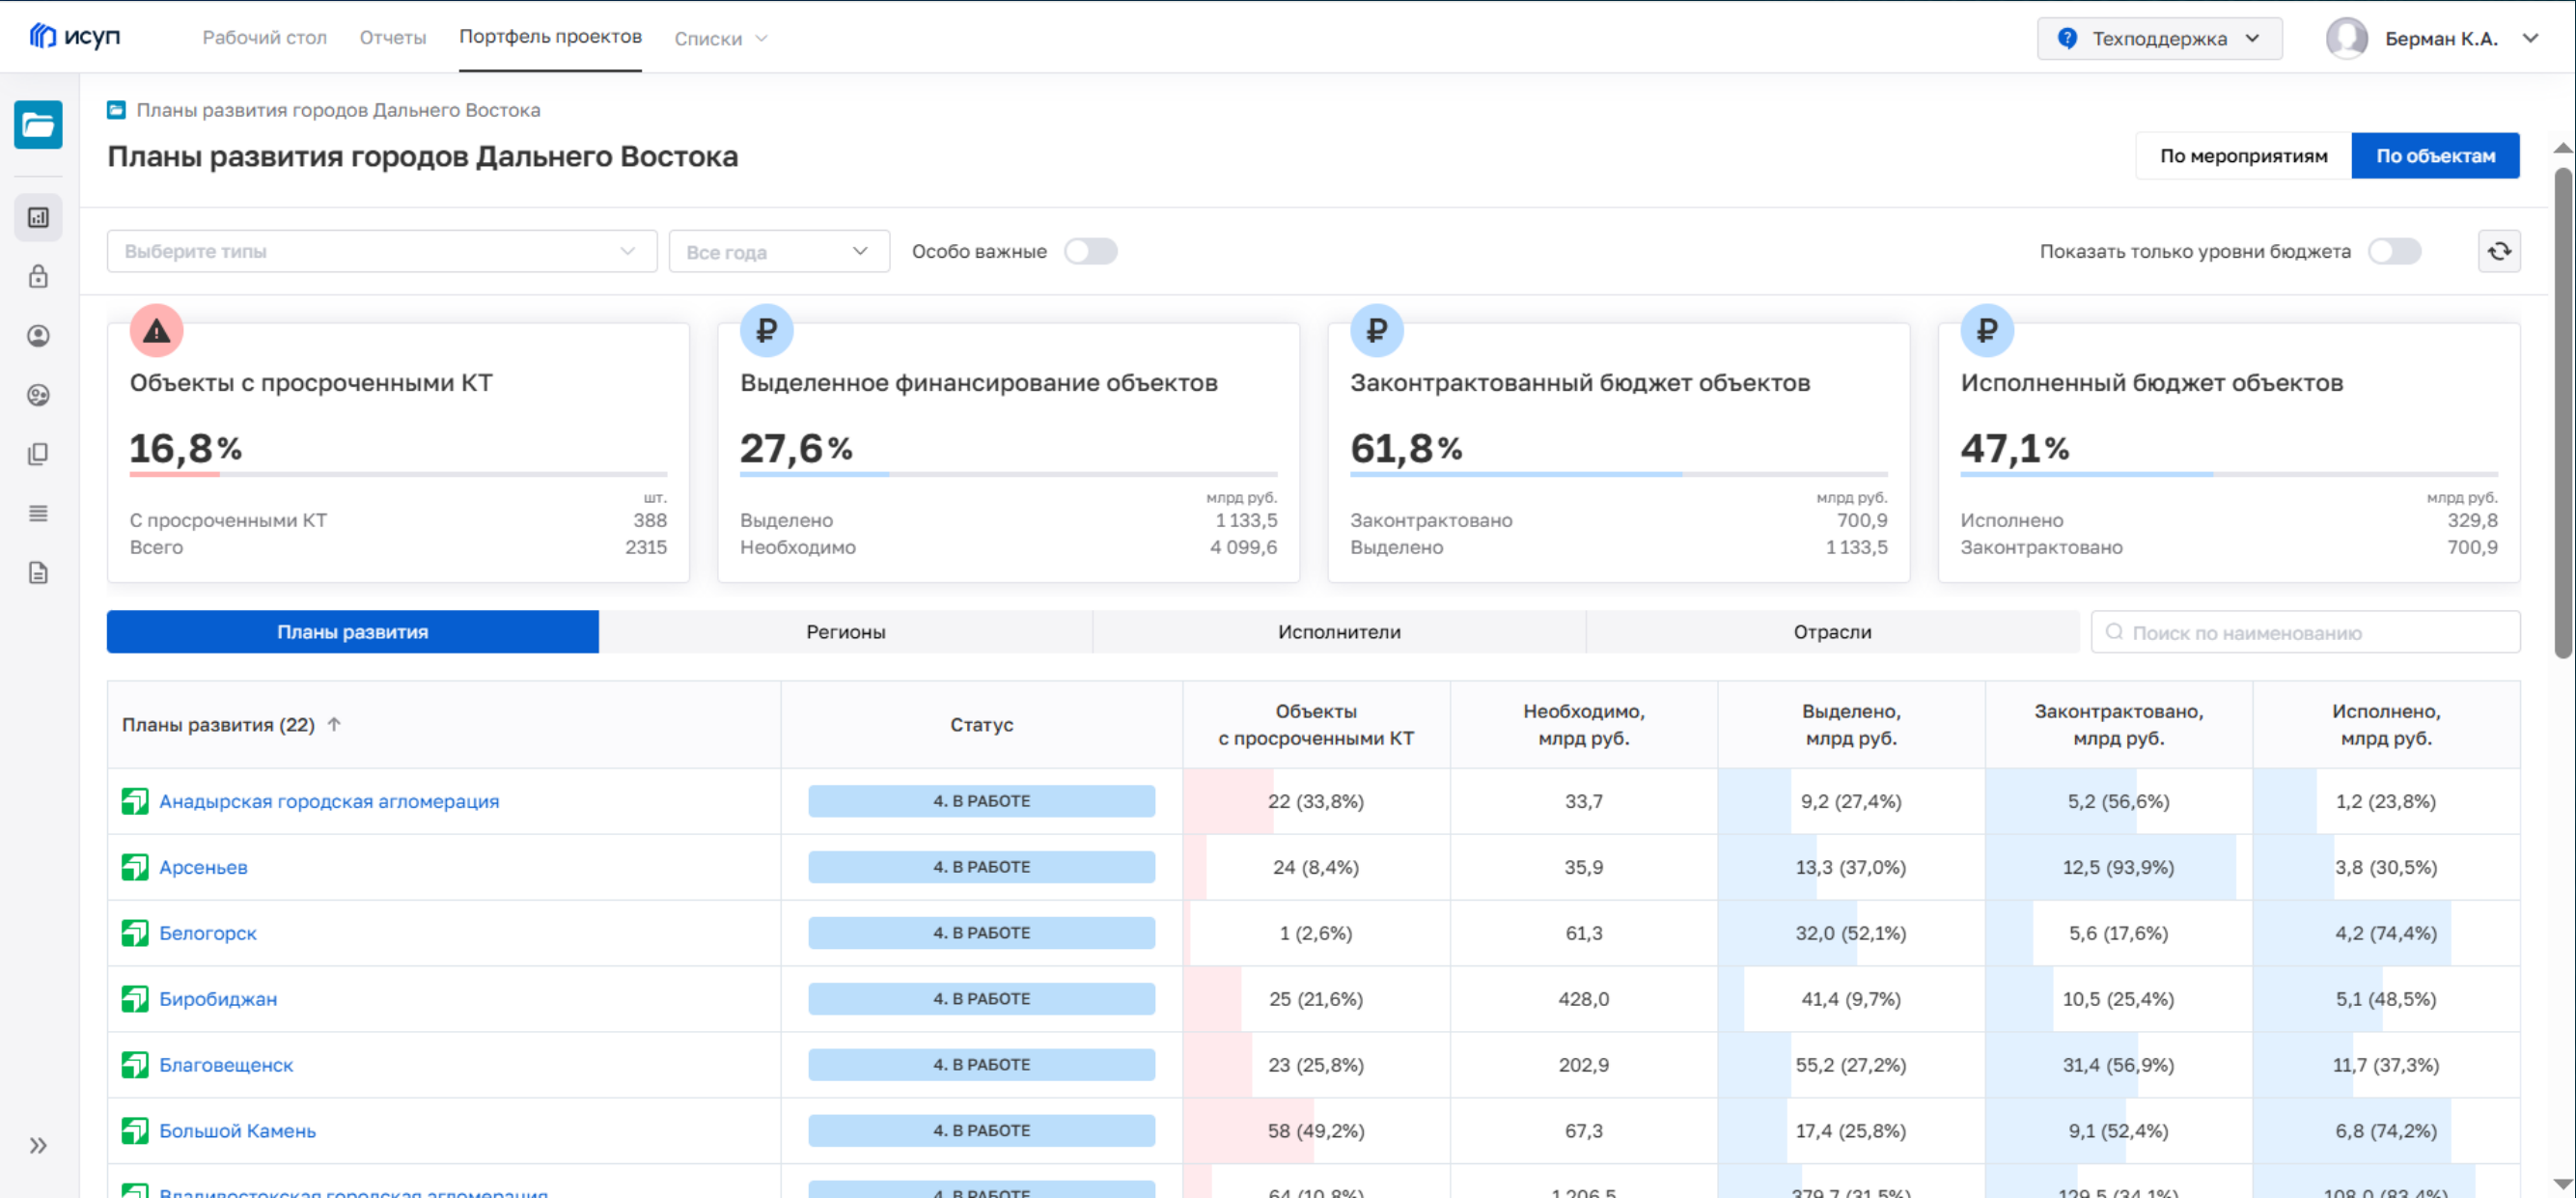

Мастер-планы 22 агломераций

Информационная система управления проектами (ИСУП) разрез источники бюджета

исуп

Рабочий столОтчетыПортфель проектовСписки

Техподдержка

Берман К.А.

Планы развития городов Дальнего Востока

Планы развития городов Дальнего Востока

По мероприятиямПо объектам

Выберите типыВсе годаОсобо важные


Показать только уровни бюджета

Поиск по наименованию

Планы развития	Регионы	Исполнители	Отрасли	
Планы развития (22)	Необходимо, млрд руб.	Выделено, млрд руб.	Законтрактовано, млрд руб.	Исполнено, млрд руб.
Итого	4 099,6	1 133,5 (27,6%)	700,9 (61,8%)	329,8 (47,1%)
ФБ	1 544,0	252,6 (16,4%)	182,8 (72,4%)	54,6 (29,9%)
КБР	510,4	196,5 (38,5%)	190,2 (96,8%)	68,4 (36,0%)
ВБ	2 045,3	684,4 (33,5%)	327,8 (47,9%)	206,8 (63,1%)
Свободный	44,2	3,6 (8,2%)	1,6 (45,6%)	0,3 (16,4%)
Якутская городская агломерация	290,1	48,7 (16,8%)	126,6 (260,1%)	7,7 (6,1%)
Биробиджан	428,0	41,4 (9,7%)	10,5 (25,4%)	5,1 (48,5%)
Южно-Сахалинская городская агломерация	110,4	75,2 (68,1%)	82,7 (109,9%)	39,5 (47,8%)
ФБ	41,4	20,6 (49,8%)	18,9 (91,8%)	5,7 (30,1%)
КБР	41,8	33,1 (79,2%)	41,6 (125,8%)	19,8 (47,6%)
ВБ	27,2	21,5 (79,1%)	22,2 (103,0%)	14,0 (63,3%)
Анадырская городская агломерация	33,7	9,2 (27,4%)	5,2 (56,6%)	1,2 (23,8%)


Мастер-планы 22 агломераций

Информационная система управления проектами (ИСУП) пример конкретного ДКП

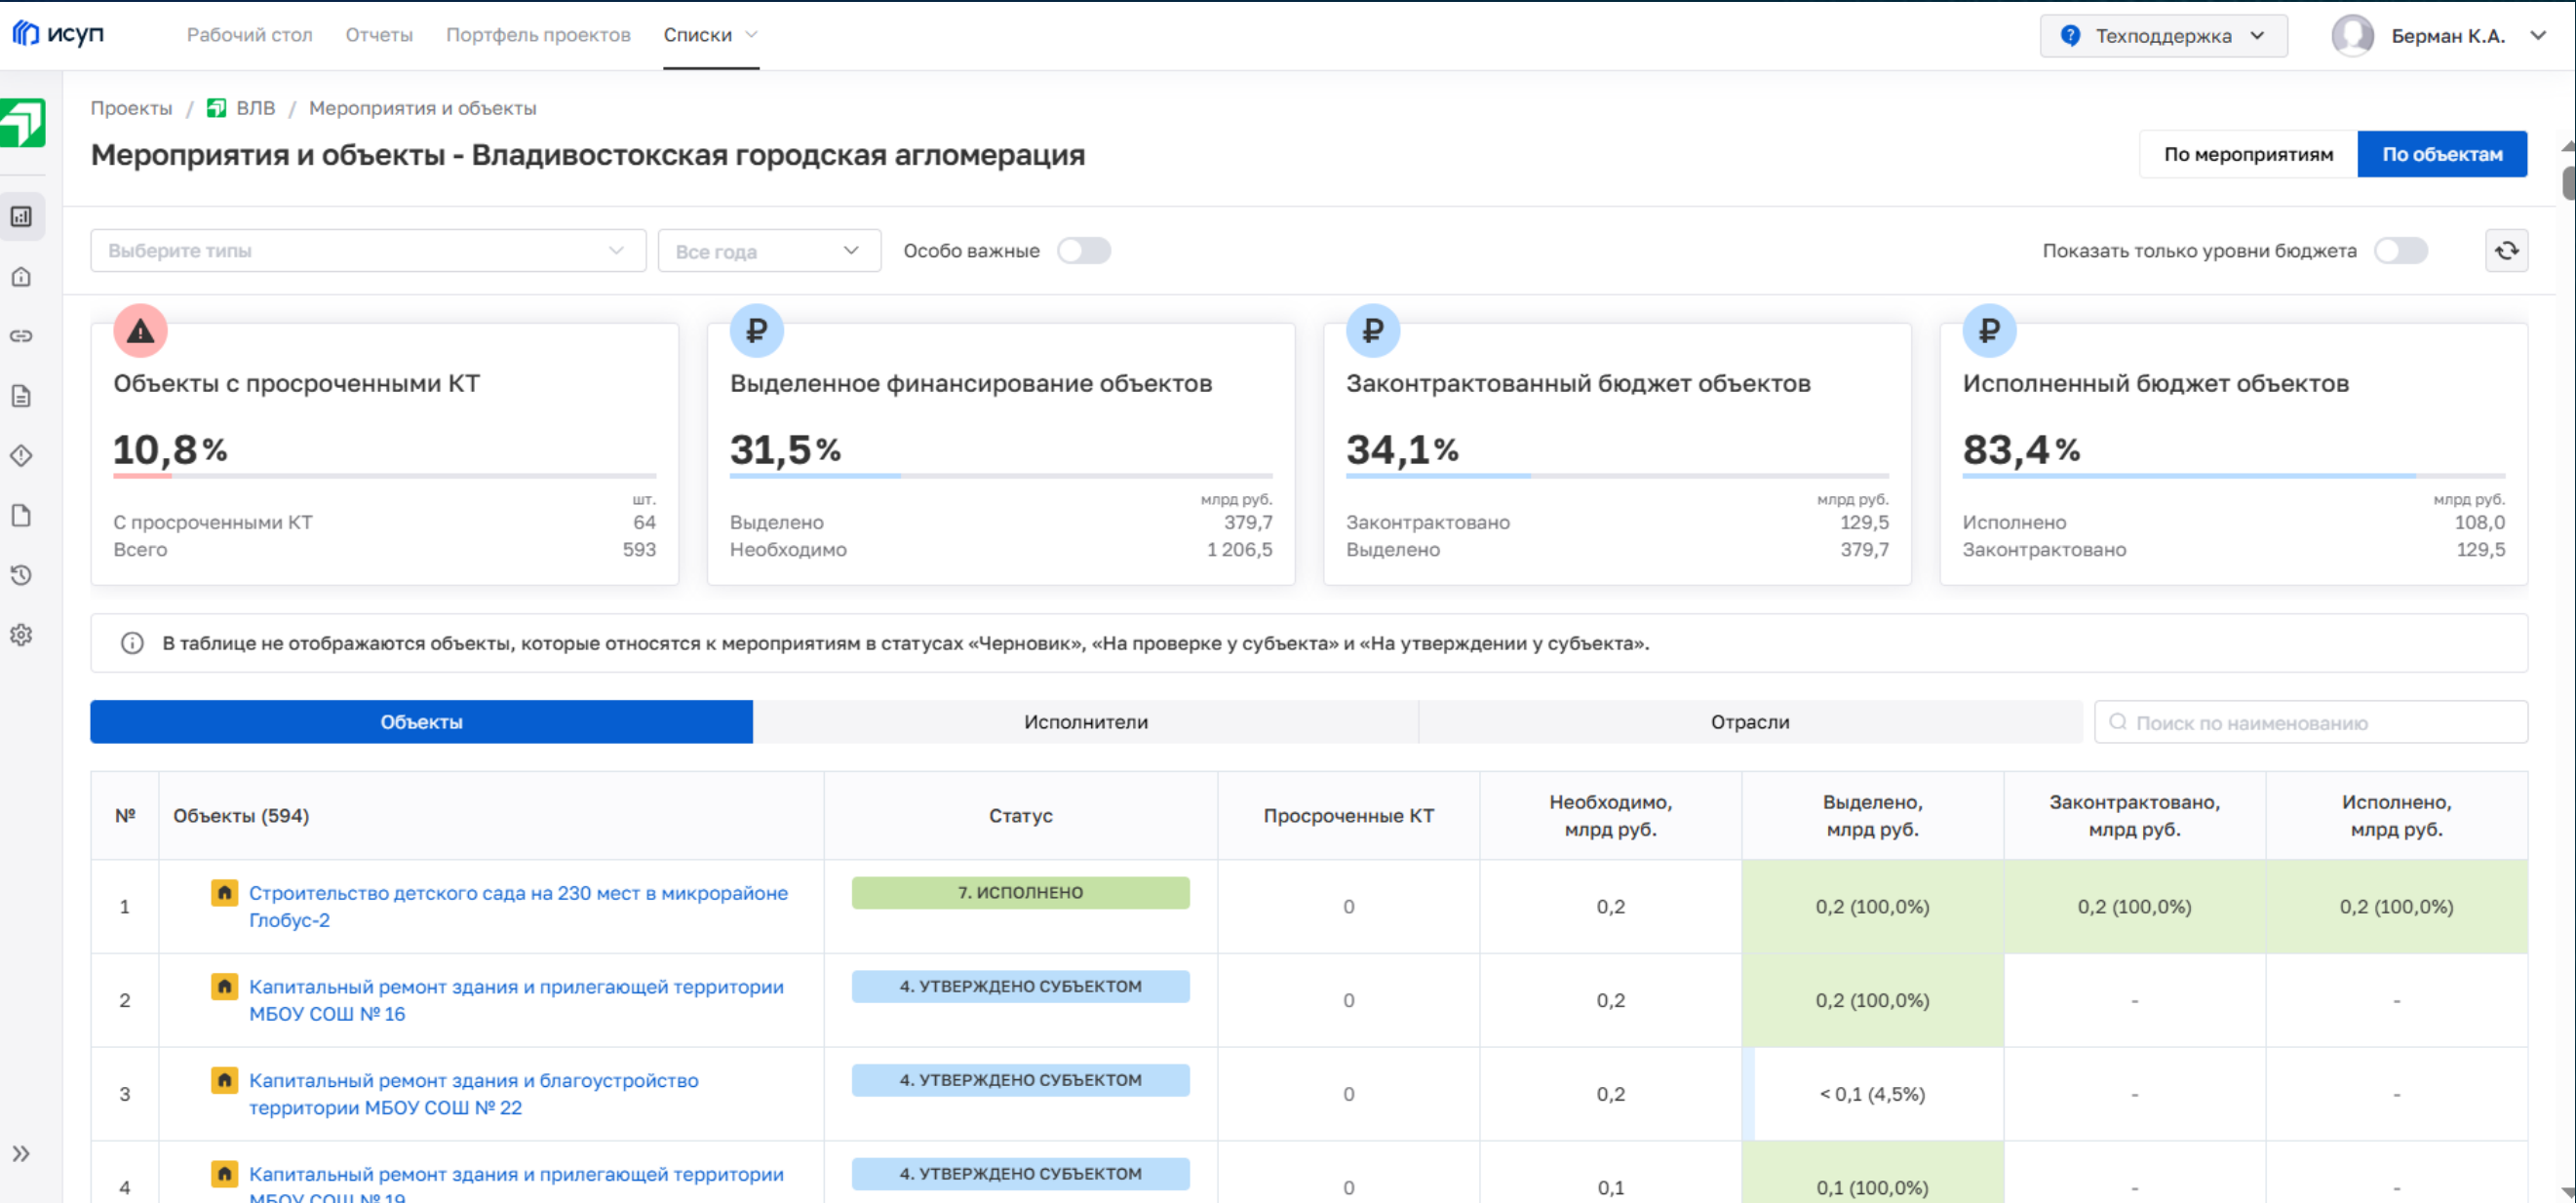

Мастер-планы 22 агломераций

Информационная система управления проектами (ИСУП) пример конкретного мероприятия

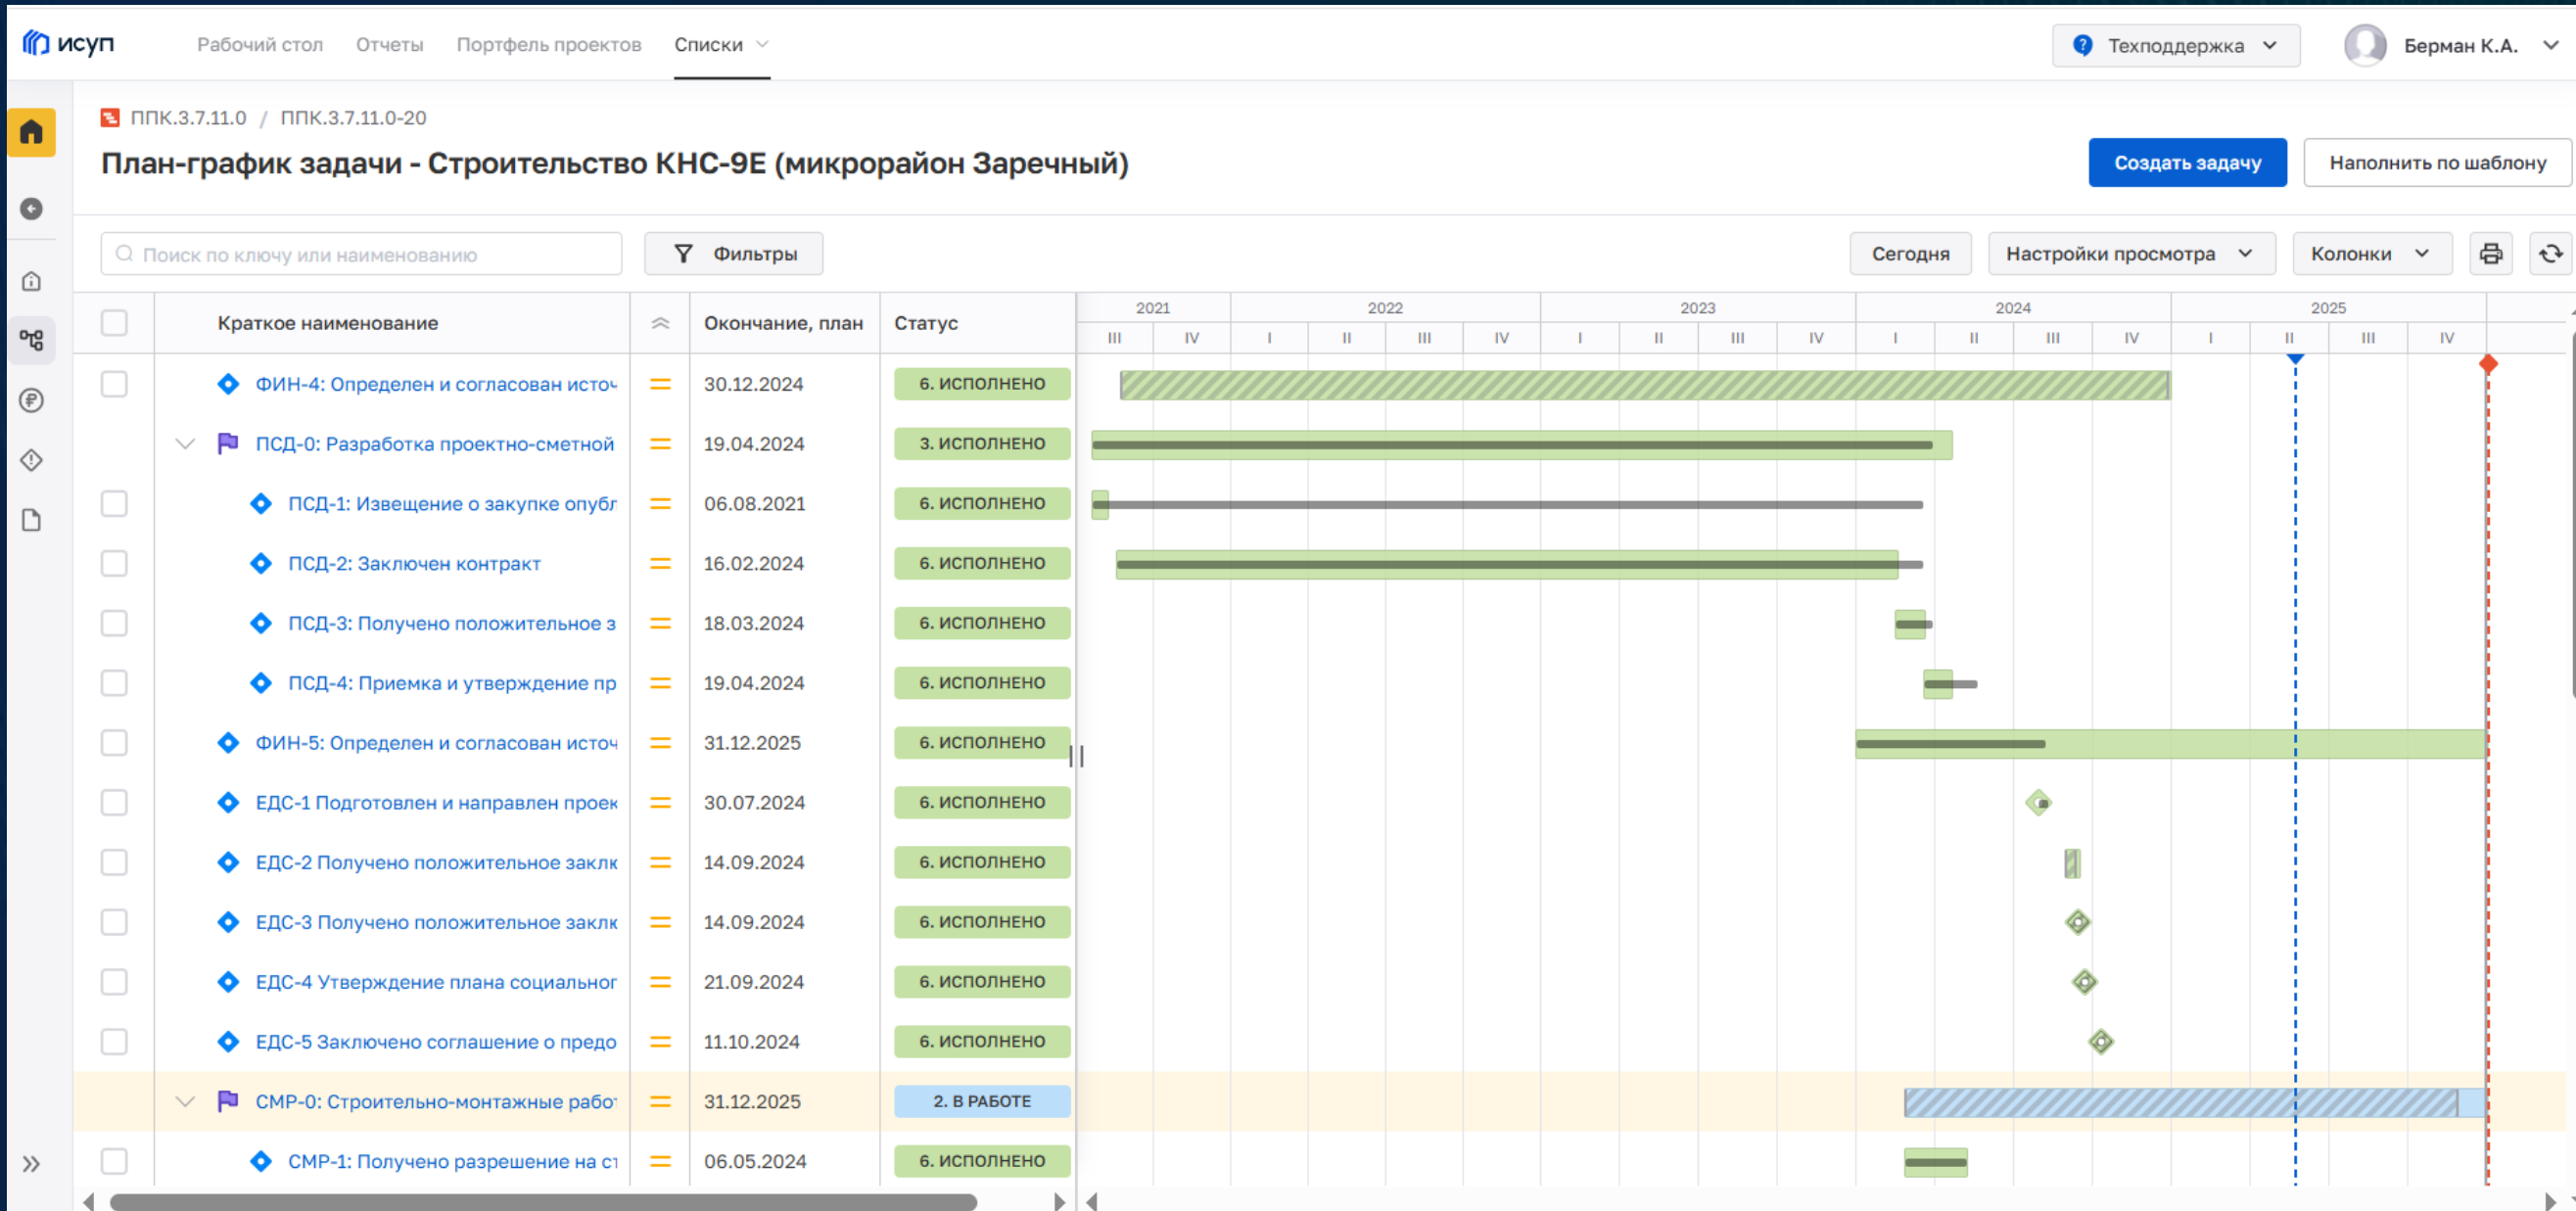

Интеграция с НСПД

← → ↺

nspsd.gov.ru/map

🔍 ☆ 📏 📄 👤

Доступно обновление Chrome

Геоинформационный портал

Поиск

Найти

3

Выделенные объекты

1

Поиск пересечений

Найдено объектов: 1

Объекты с подтвержденным местоположением, реализуемые в рамках программы развития городов Дальнего Востока: Благоустройство ул. Ленинской, ул. Советской, ул. Партизанской с прилегающими общественными территориями

Идентификатор объекта

29960286-2044-414d-bfa7-107c3f6dd575

Полное наименование объекта

Благоустройство ул. Ленинской, ул. Советской, ул. Партизанской с прилегающими общественными территориями

Плановая дата начала реализации объекта

2023-03-15

Плановая дата окончания реализации объекта

2027-10-01

Статус объекта

4. В работе

Кадастровый номер

41:01:0010122:54
